



OPC 理貨、關務辦公室貨櫃屋—作業一部

需求：

- 1. 需要二個 40 呎貨櫃(不限 HQ 及 DC，但需一致)，皆為獨立辦公室。
- 2. OPC 理貨、關務辦公室施工方式：
 - (1) 貨櫃門更改為活動拉門(內涵鎖)及設置雨遮。
 - (2) 貨櫃門右側開 2 個標準窗(含紗窗)(圖 1); 左側近櫃門開 1 個標準窗(含紗窗)(圖 2)。
 - (3) 貨櫃上方需架設可拆式屋頂並預留屋頂吊掛點。
 - (4) 簡易裝潢，需隔熱。



(圖 1)




(圖 2)

3. 室內需求：

電力需求：

- (1) 總配電箱一組 160A。電力引線口開在貨櫃門板右側邊版(圖 1 紅框處)。
- (2) AC220V 冷氣插座 AC220V 30A 二座(其中一座備用)各為獨立迴路，共二迴路 60A。
- (3)室內照明六盞 4 呎 LED 28w，附多段開關(每 2 盞一開關) 為一獨立迴路 20A。
- (4)另外 AC110V 20A 插座(雙插 4 組，共 8 插)，需單獨迴路 AC 110v 插座，每個雙插座為一單獨迴路，共需四迴路獨立共 80A。
- (5) 110V*4pcs 離地高 150-160cm 設置；110V*3pcs 窗下離地高 40-60cm

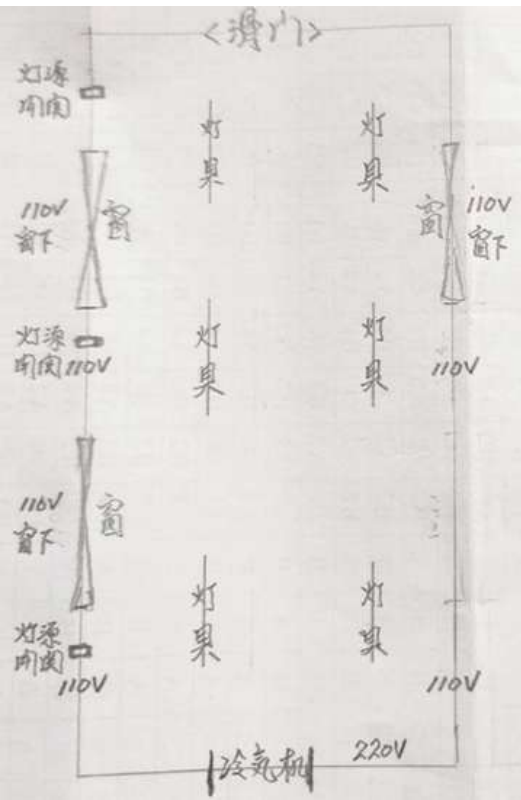

(電力開關俯視圖)

OPC 理貨、關務辦公室配電盤	
160A	
200V 30A 冷氣#1	110V 20A
200V 30A 冷氣#2	110V 20A
	110V 20A
	110V 20A
